

**Region
Hovedstaden**

REGION

Elektroniske Genoptræningsplaner (GOP) - et samarbejde mellem sektorer


It-konsulent Gitte Femerling, Hillerød Kommune

Konsulent Dorthe Skou Lassen, MedCom

Specialkonsulent Birthe Hermansen, Koncern IT, Region Hovedstaden

E-sundhedsobservatoriet Årskonference 21. og 22. oktober 2009

Build a plane in the air!

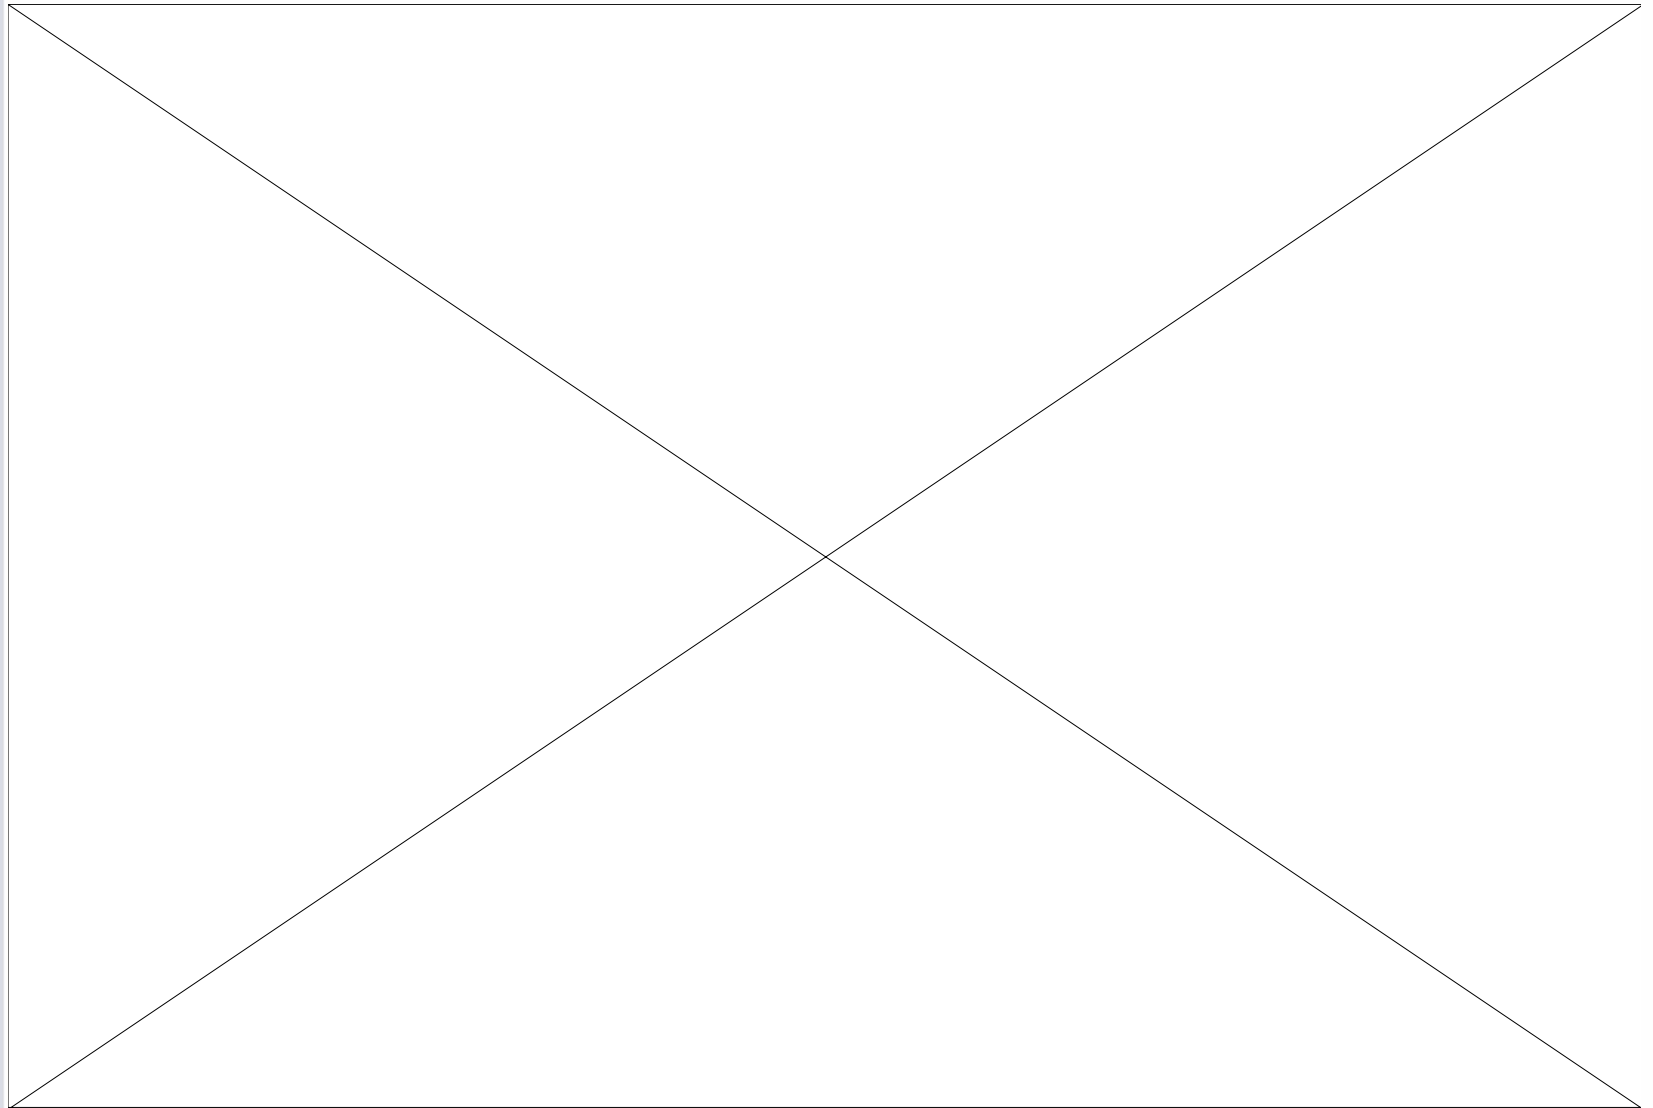

Vores præsentation

- Udfordringer og succeser i samarbejde om udvikling af en national standard på tværs af sektorer
- Pilot-projektet nationalt og regionalt
- anbefalinger til lignende projekter



Baggrund

Strukturreformen 2007 §§

Standarden



Regionale
Sundhedsaftale



Region
Hovedstaden



HILLERØD
KOMMUNE

Hvad er en GOP?



Dataindholdet i standarden

Administrative oplysninger

- Persondata
- Afsender - Modtager
- Kontakt
- Ambulant kontrol
- Praktiske oplysninger


Genoptræning


- Type af genoptræning
- Diagnose
- Kliniske oplysninger (intervention)

Funktionsevne

- Funktionsevne (målinger og beskrivelser)
- Genoptrænings behov
- Hjælpemidler

Hvor svært kan det være?

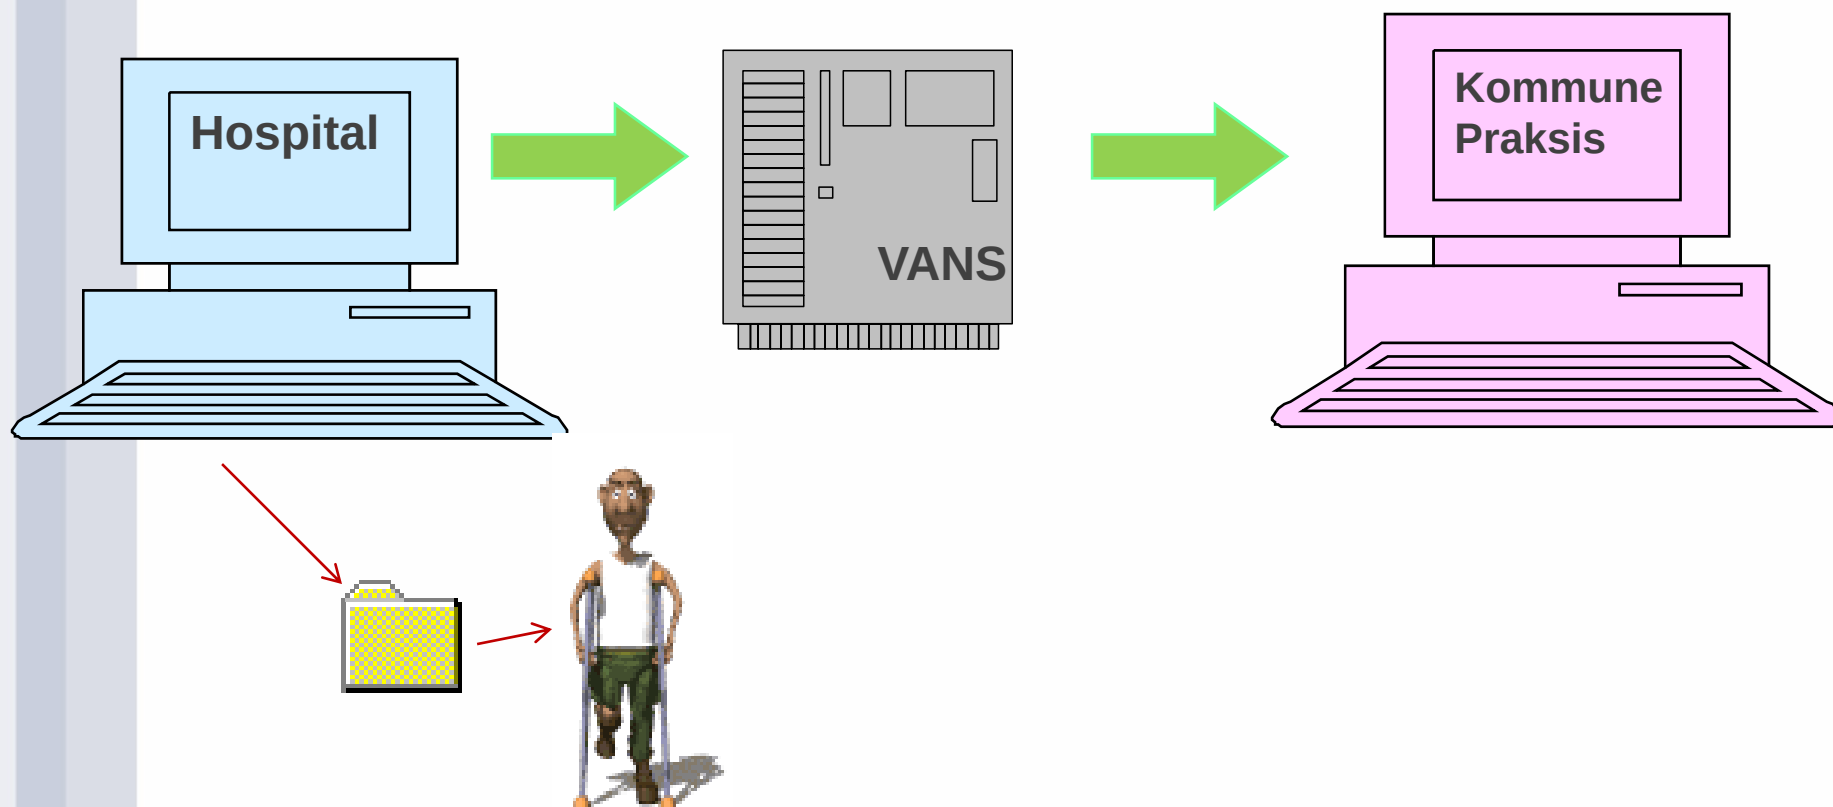


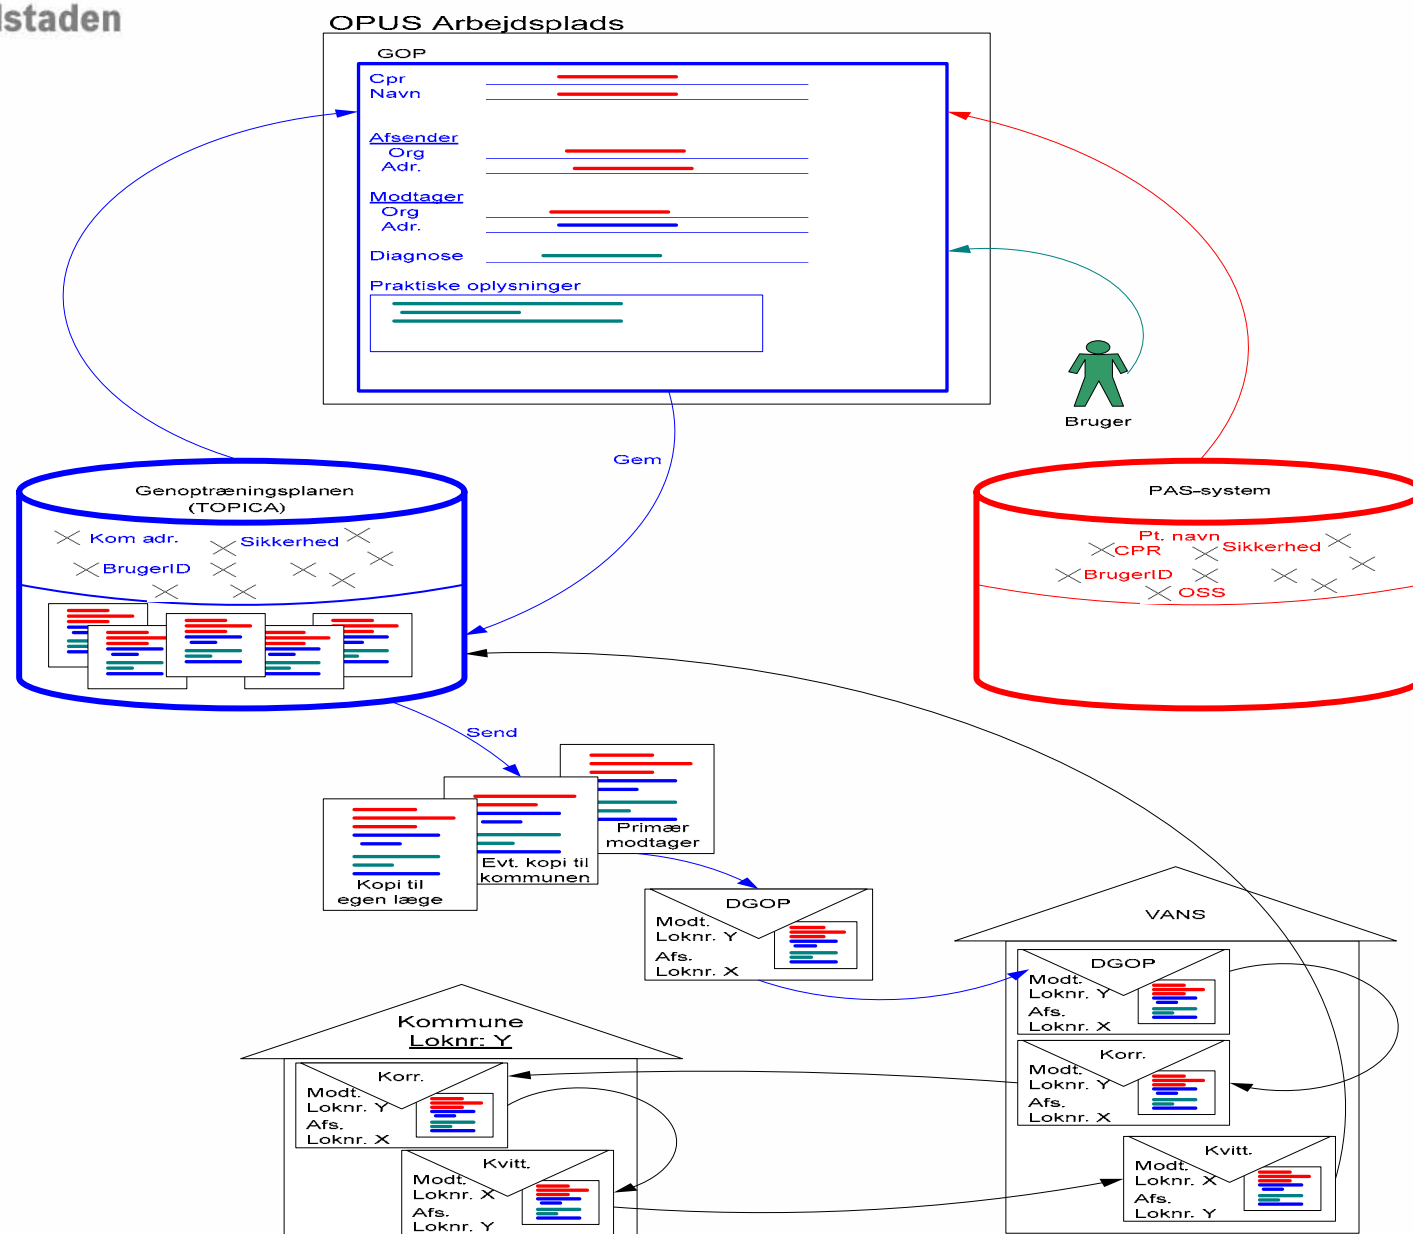








Udfordringer




og anbefalinger

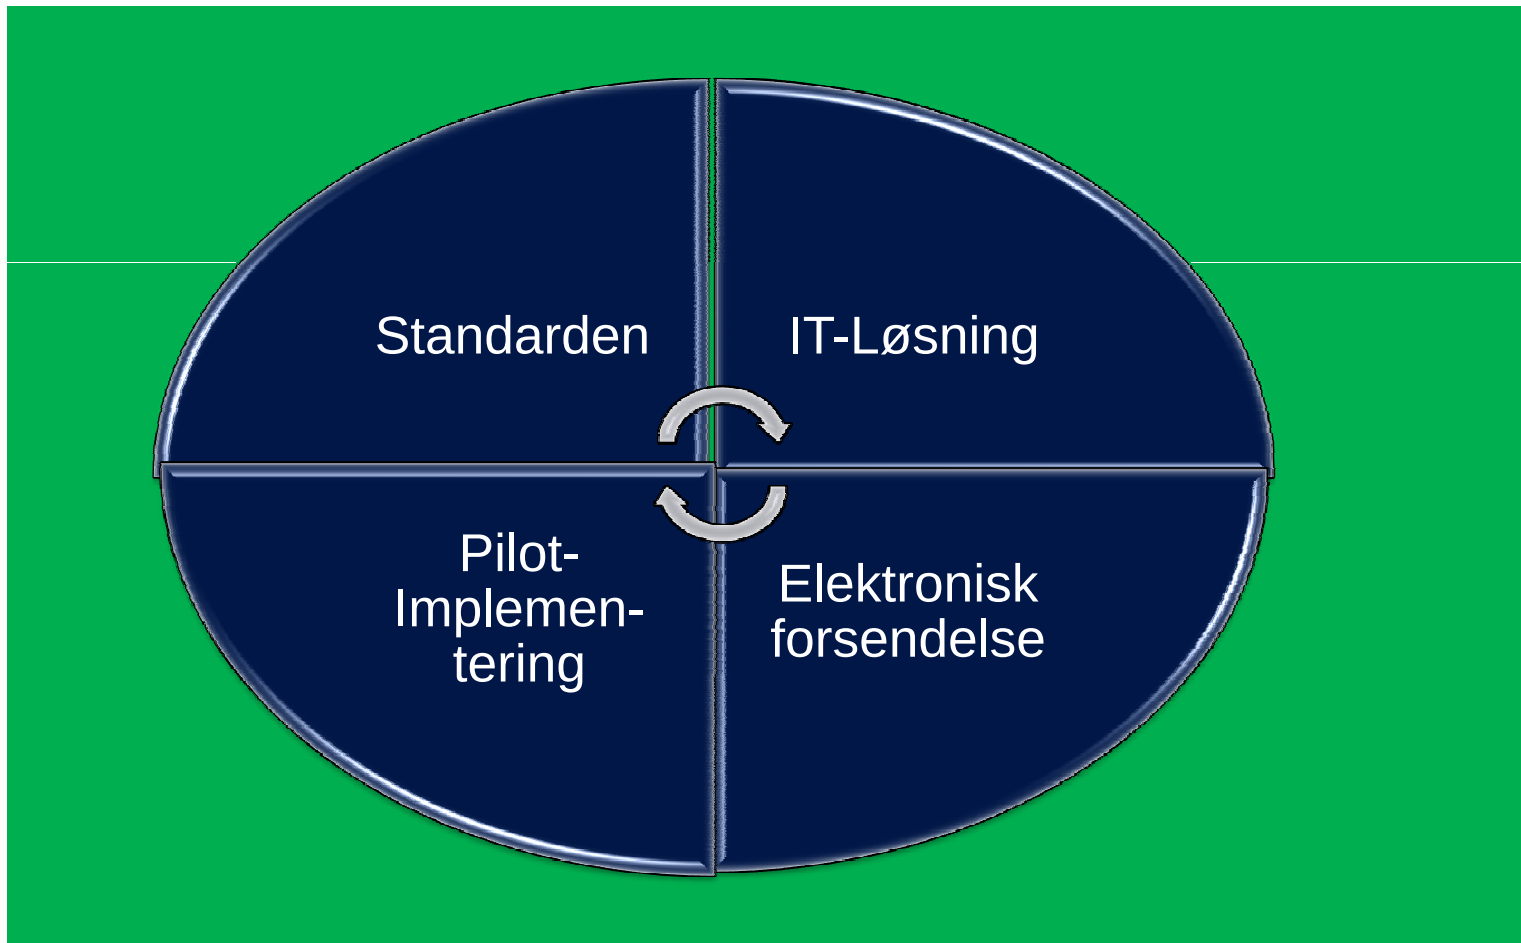

Mange interessenter



Udvikling og pilotimplementering af standarden

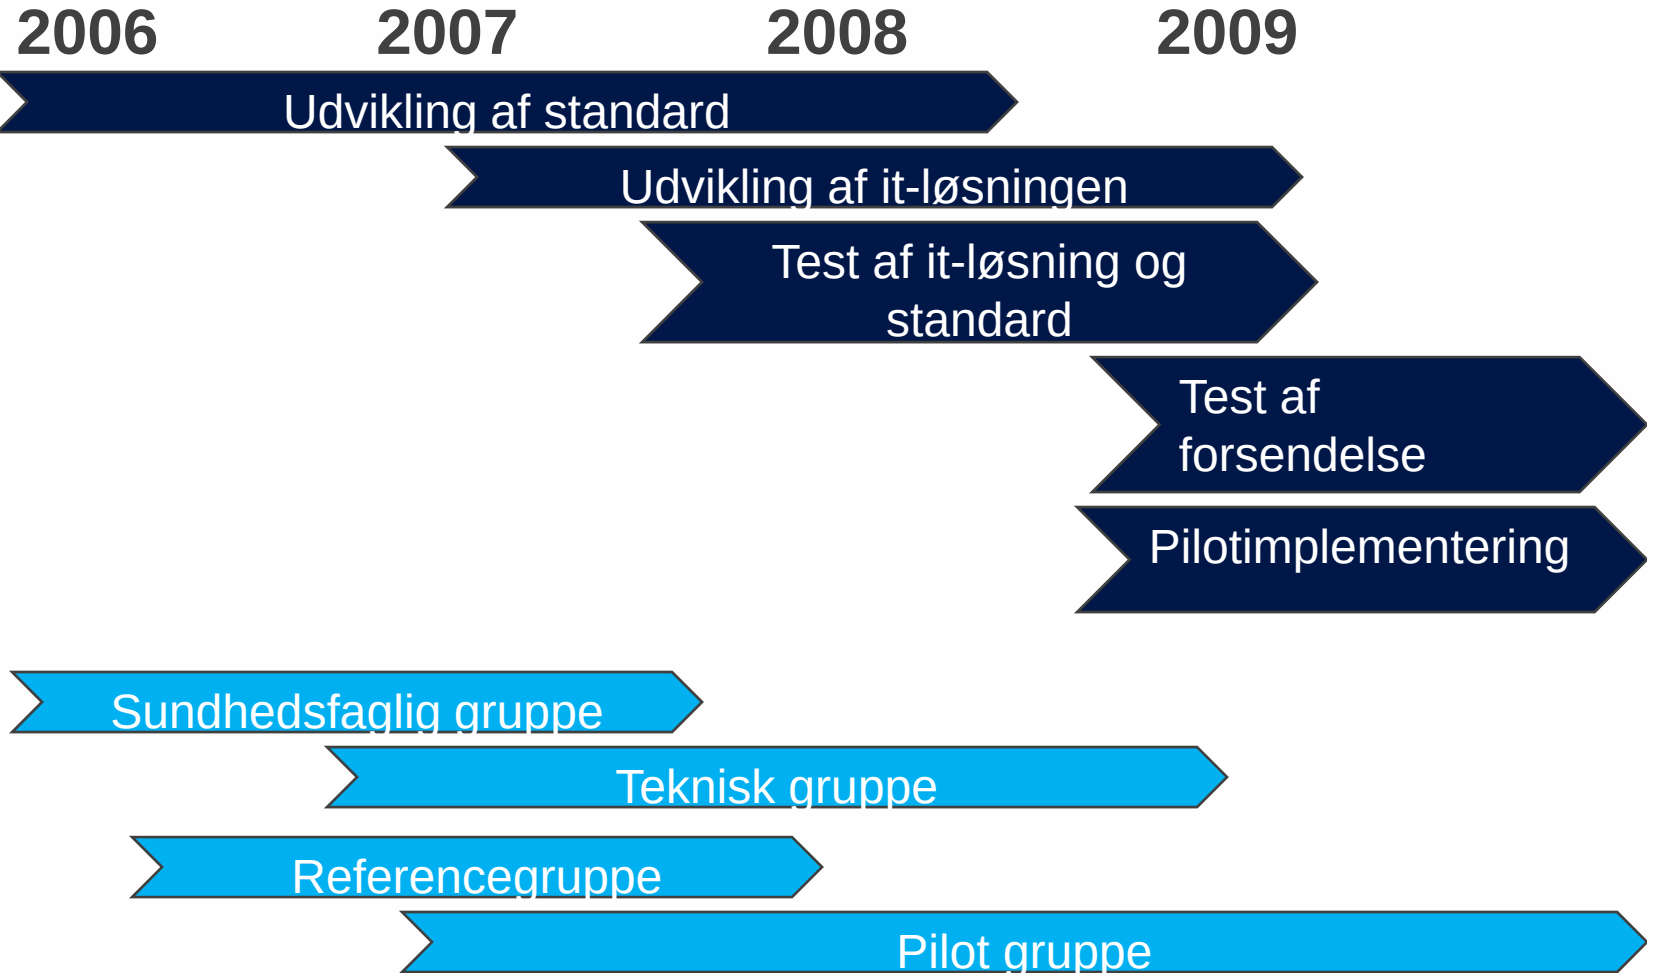

Standarden

GOP

Genoptræningsplan Side 1 af 4

Sendes til kommune / sygehus	
Adresseoplysninger	Personoplysninger
Svendborg kommune Visitationsskolen, terapirådet Svinget 4 5700 Svendborg	Personnummer, navn, adresse og evt. telefonnummer 150981-4844 Brita Berggren Park Alle 48 7120 Vejle

Praktiske oplysninger

Følg andet sprog end dansk, kørestol, handicap, anden indkaldelsesadresse, særlige ønsker, ønsket behandlingstid og -sted, kørselsbehov

Anvender støtte skal have hjælp til ind og ud stigning.

Kopi til egen læge Afsender/henvisende afd., sygehus, region

UDFORDRINGER

Standarden

Områdets
modenhed

Rumme hele
virkeligheden

Lang
projektperiode

ANBEFALINGER

- Kortlægning af området
- Fokus på databehov
- Need to have
- Repræsentativ national gruppe
- Krav til ressourcer og kompetencer i pilot-samarbejdsaftale
- Realistiske tidsplaner – afsæt 1-1½ år

IT-løsningen

UDFORDRINGER

IT
løsningen

Krav til it-
løsningen

Præsentations
laget

ANBEFALINGER

- Skelne mellem krav til standarden og krav til it-løsning
- Præsentationsdata skal ikke medsendes i meddelelsesbaseret kommunikation

Mellemrum – mangler!

Forhold vedrørende første indkaldelse F.eks. andet sprog end dansk, kørestol, handicaps,
anden indkaldelsesadresse, særlige ønsker, ønsket behandlingstid og -sted,
kørselsbehov fgdg Dato for første kontakt med kommune/sygehus: 2007-09-01 Kontakt for mere
information, vedr. f.eks. spørgsmål omkring frit valg m.m. Kontakt i kommunen Kontor /
afdelingsnavn Viborg Kommune Adresse: Ukendt gade 22 Postnummer: 8800 Bynavn:
VIBORG Telefon: 87 25 26 40 Kontakt i regionen Kontor / afdelingsnavn Patientkontoret Adresse:
Skottenborg 26 Postnummer: 8800 Bynavn: Viborg Telefon:
87 28 48 70 Udskrivningsdato/Ambulatoriedato: 2007-09-01 Indlæggelsesdato:
2007-09-10 Ambulant kontrol på sygehus: Ved ikke Henvisningsdiagnose for
genoptræningsforløb ICD10 Kodebetydning Z59 Problemer i forbindelse med boligforhold og økonomiske
forhold Sekundære diagnoser SKS ICD10 ICD10 Kodebetydning I119 Morbus cordis hypertensivus
uden inkomensation G579 Mononeuropati på underekstremitet uden specifikation F739 Mental
retardering sværest med påvirkning af adfærd u spec T439 Forgiftning med psykotroptmiddel


æ ø å mangler!

08.01.08 Patienten er i dag faldet og har slet venstre skulder. Objektivt Der ses misfarvning midtskafte og medalt p venstre humerus. Let hvelse svarende til til skulderregionen. Ingen fejlstilling. Der findes direkte og indirekte osse mhed svarende til proksimale humerus. Normale neurovaskulre forhold perifert. Rntgen viser disloceret venstresidig collum cirrhuricum fraktur svarende til type 3. Behandling Der anlgges fikseret mitella, og patienten fr tid i ortopdkirurgisk ambulatorium om 1 uge til kontrol inkl. rntgen. Ved ambulatoriekontrol kan patienten muligvis overg til ls mitella. Hjemmepleje adviseres med henblik p hjlp i hjemmet.

Annikke Winther/oula roosvalds

Elektronisk forsendelse

UDFORDRINGER

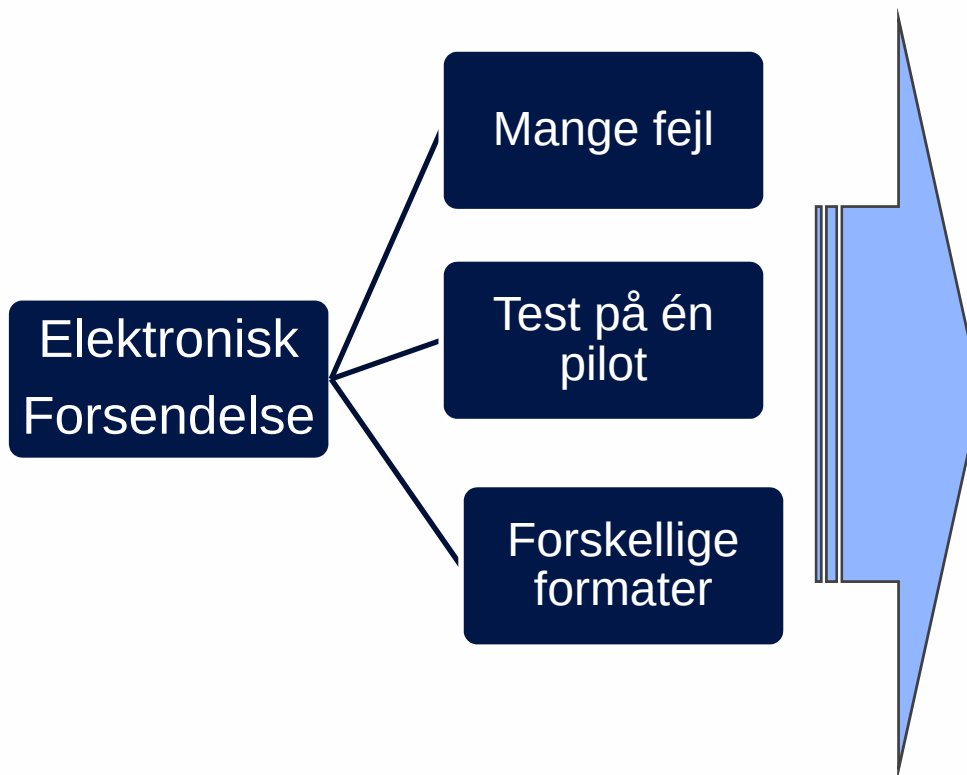


ANBEFALINGER

- Koordinerede test
- Dokumentation og opfølgning.
- Fejludredning er et samarbejde!
- Test, test og atter test.

Pilot-implementering

UDFORDRINGER

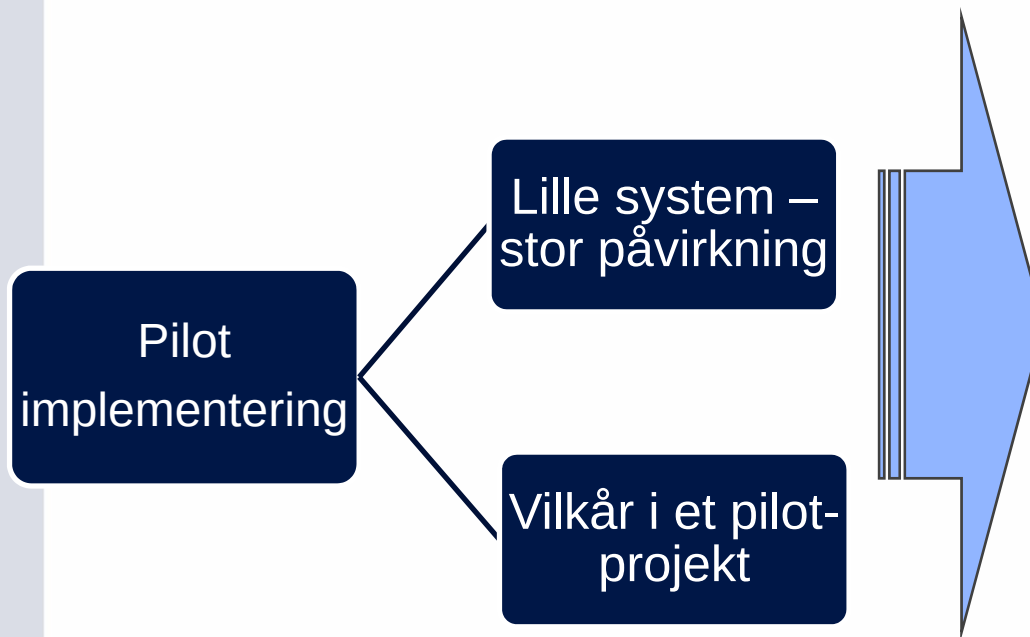

ANBEFALINGER

- IT-udviklingsprojekt med lokal projektledelse
- To pilot-implementeringer
- Tværsektoriel lokal projektgruppe
- Implementeringspakke – den videre opfølgning

GOP - implementeringspakke

Implementering - Region H



Hovedstadens EPJ - H-EPJ

▸ ParakliniskSvarModul PSM

▸ SFI Implementering

▼ OPUS
Genoptræningsplan

Nyheder

Grundlag

Lær OPUS
Genoptræningsplan

Evaluering og
effektvurdering

▼ GOP implementering

▸ Kommuneliste

▸ Digital Diktering


▸ Effektvurdering

▸ E-journal

▸ EPM PDA

▸ Berørte

Implementering af OPUS Genoptræningsplaner.

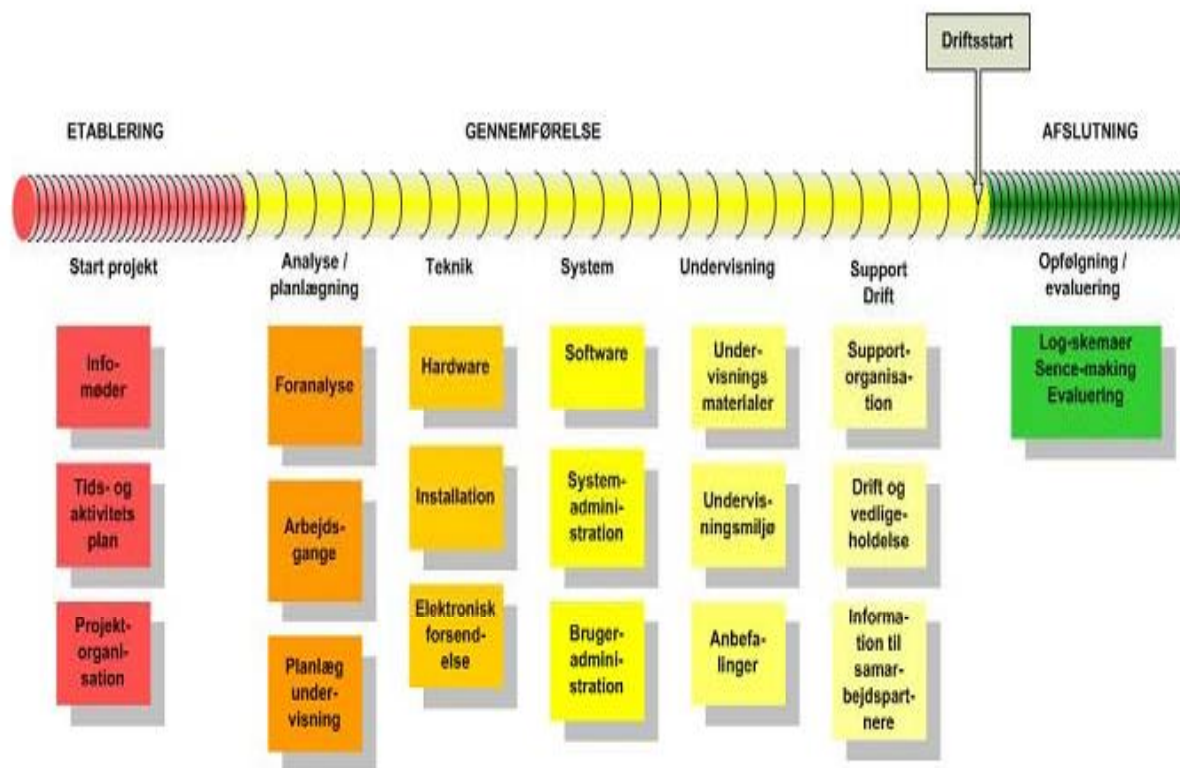

Succes'er



- Stort udbytte med netværk på tværs i regioner og kommuner, med udveksling af erfaringer om eksempelvis arbejdsgange, test og pilot-implementering.
- Deltagerne i pilotprojektet har været glade for at medvirke til udviklingen af en sundhedsfaglig standard
- GOP har overlevet trods alle odds – takket være frontløbere og ildsjæle
- Når et databehov er til stede – så lykkes det ☺

Spørgsmål ?



For mere information kontakt:

Gitte Femerling:
gife@hillerod.dk

Birthe Hermansen:
birthe.hermansen@regionh.dk
